#4 [調査中] 配線仕様
盤：L-2
回路：L-2-18
配線：VVF 2.0-3C（単相200V）
場所：2F 給湯室 IH
調査：鈴木 2026-10-20
IH専用回路。天井内の経路を確認中

#2 [未確認] 回路番号
盤：L-2
回路：不明（L-2-12？）
配線：VVF 2.0-3C
場所：2F 会議室 コンセント
調査：鈴木 2026-10-20
盤に回路表示なし。負荷側から特定できず


#3 [要再調査] 確認事項
盤：P-2
場所：2F 機械室 動力盤
調査：鈴木 2026-10-20
盤扉施錠のため内部未確認。管理会社に鍵を手配して再調査

#1 [確認済] 盤名
盤：L-2
回路：L-2-01〜L-2-30
配線：幹線 CV 22sq-3C
場所：2F EPS 電灯分電盤
調査：鈴木 2026-10-20
主幹 3P 100A・分岐30回路（予備2）。銘板と回路表示が一致

盤・回路 現地調査票 / 記録 #1

元図面：山田ビル_2F_電灯コンセント既設図.pdf / 1 ページ


#1 [確認済] 盤名
盤：L-2
回路：L-2-01〜L-2-30
配線：幹線 CV 22sq-3C
場所：2F EPS 電灯分電盤
調査：鈴木 2026-10-20
主幹 3P 100A・分岐30回路（予備2）。銘板と回路表示が一致

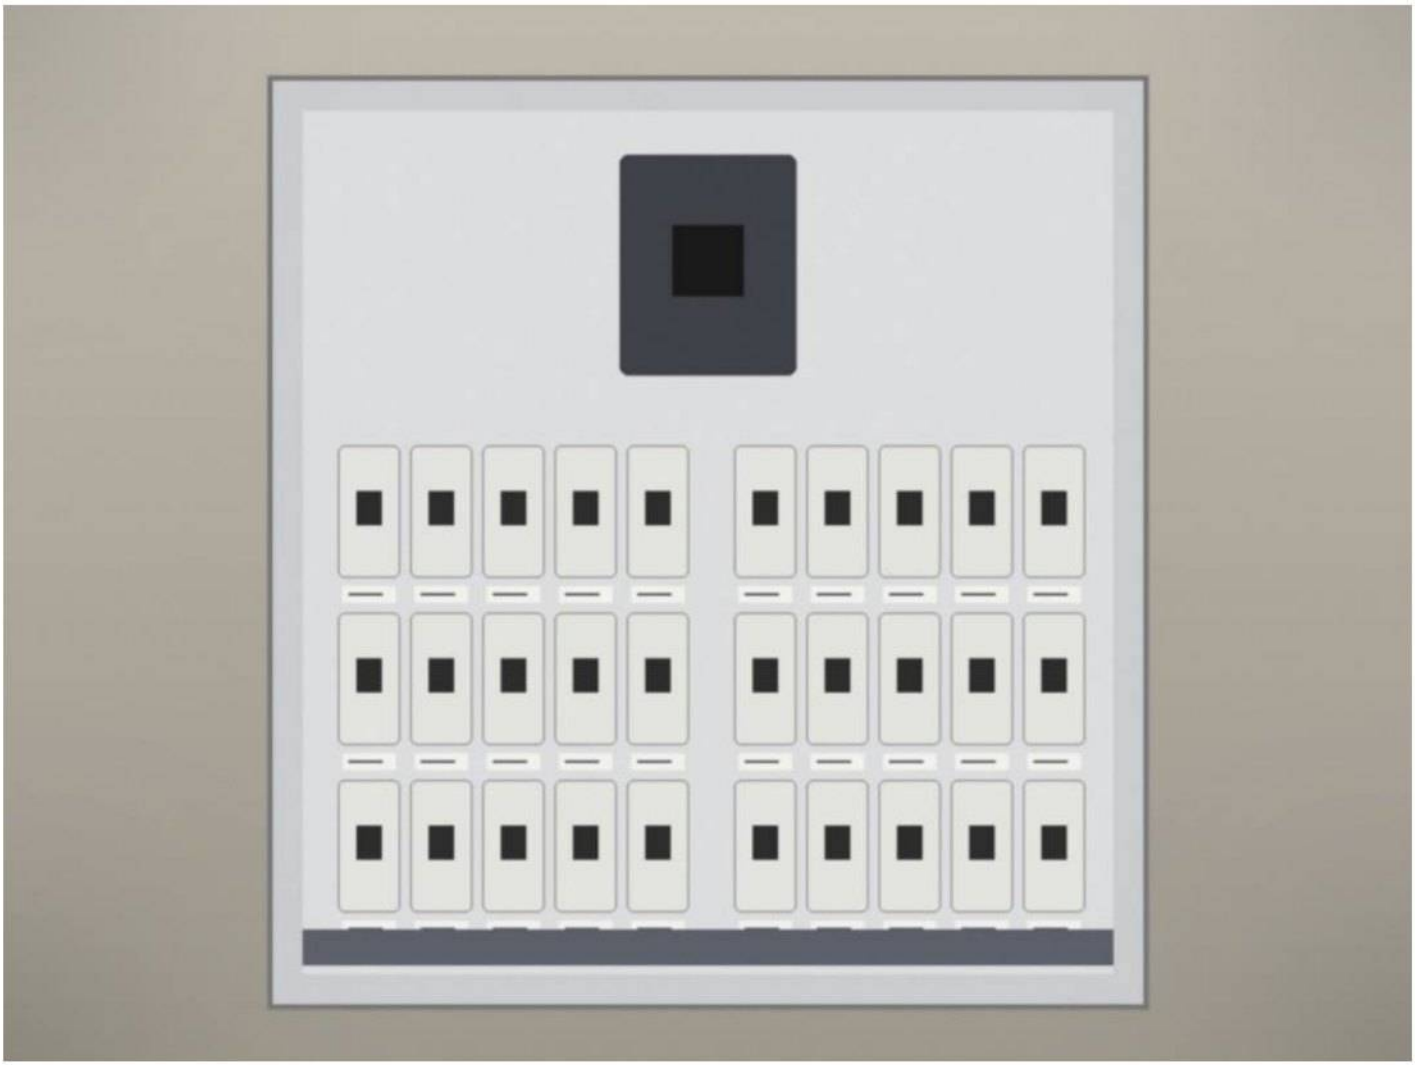

盤・回路 現地調査票 / 記録 #2

元図面：山田ビル_2F_電灯コンセント既設図.pdf / 1 ページ

#2 [未確認] 回路番号
盤：L-2
回路：不明（L-2-12？）
配線：VVF 2.0-3C
場所：2F 会議室 コンセント
調査：鈴木 2026-10-20
盤に回路表示なし。負荷側から特定できず

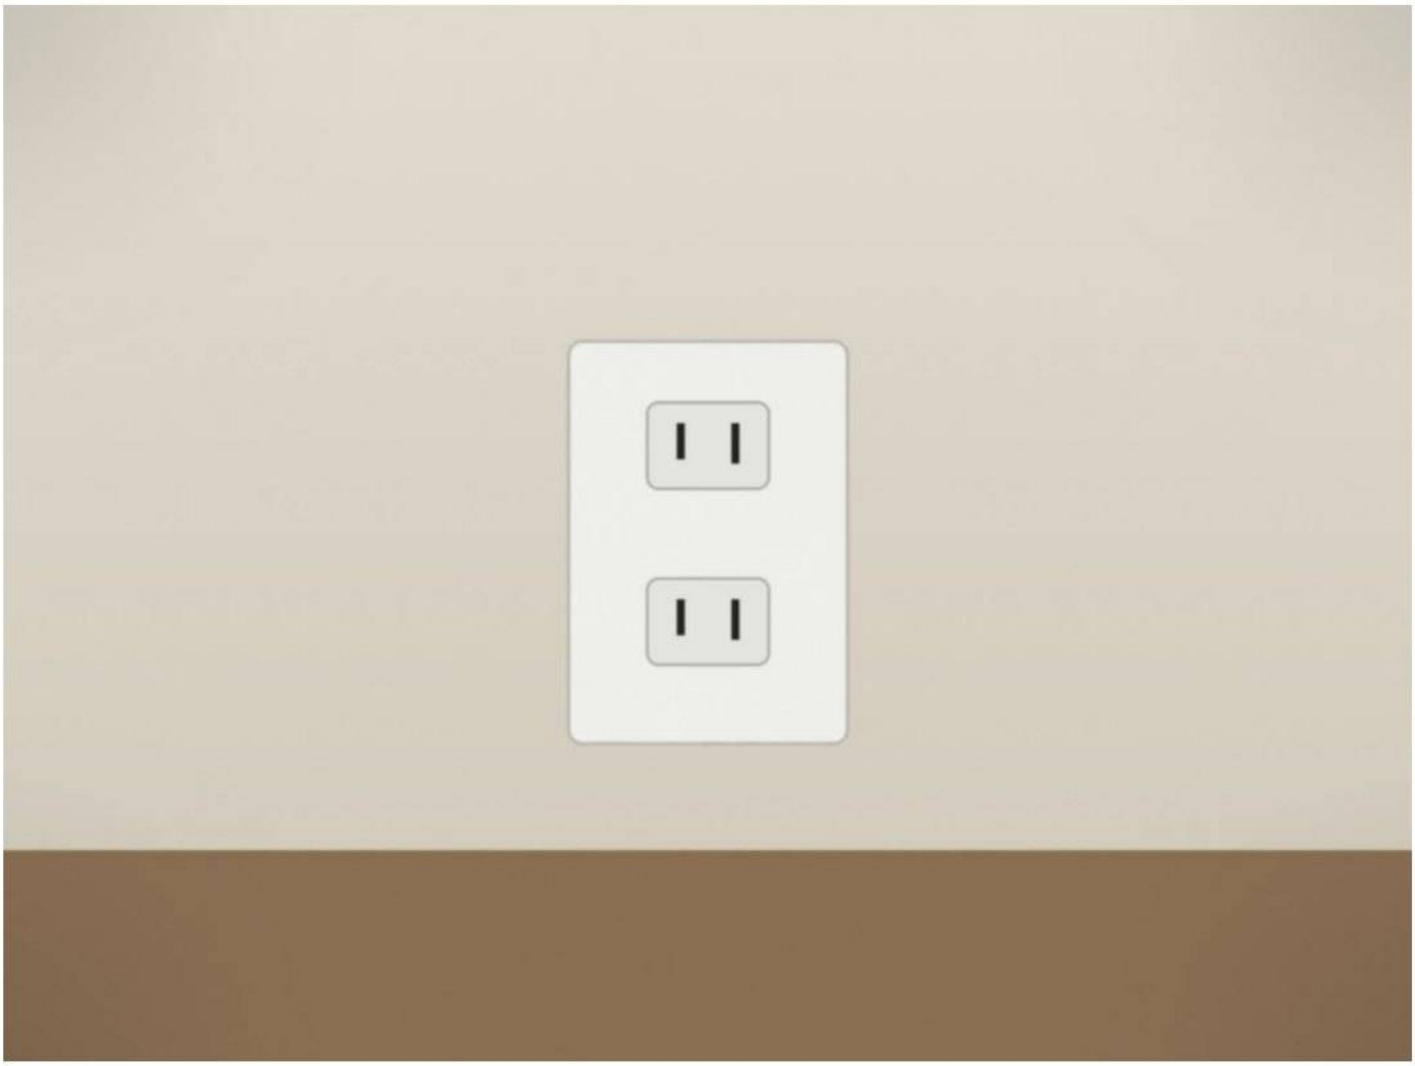

盤・回路 現地調査票 / 記録 #3

元図面：山田ビル_2F_電灯コンセント既設図.pdf / 1 ページ

#3 [要再調査] 確認事項
盤：P-2
場所：2F 機械室 動力盤
調査：鈴木 2026-10-20
盤扉施錠のため内部未確認。管理会社に鍵を手配して再調査



盤・回路 現地調査票 / 記録 #4

元図面：山田ビル_2F_電灯コンセント既設図.pdf / 1 ページ

#4 [調査中] 配線仕様
盤：L-2
回路：L-2-18
配線：VVF 2.0-3C（単相200V）
場所：2F 給湯室 IH
調査：鈴木 2026-10-20
IH専用回路。天井内の経路を確認中

